

**RADIO SONORA**
Oficio de Comisión

Hermosillo, Sonora, 21 de abril del 2025.

JORGE LUIS GARCIA DURAZO
Técnico en Comunicaciones
P r e s e n t e.

Por medio del presente se le comisiona para que en representación de Radio Sonora realice lo siguiente:

Objetivo o Propósito de la comisión:

Realizar visita de trabajo a las repetidoras de Bacerac y Granados para realizar servicios de mantenimiento preventivo.

Lugar a donde es comisionado:

Bacerac y Granados, Sonora

Periodo que comprende la comisión:

Del 22 y 23 de abril de 2025

Lic. Tirso Amante Jerez
Director General de Radio Sonora



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
GRANADOS, SONORA.
ADMINISTRACION
2024-2027



RADIO SONORA
Gobierno del Estado de Sonora

**H. AYUNTAMIENTO
DE BACERAC, SONORA.**

22 ABR. 2025

RECIBIDO

DEPARTAMENTO TECNICO

FORMATO DE INSPECCION GENERAL EN SITIO

DATOS GENERALES: BACERAC GRANADOS		
DD: 23	MM:04	AA: 2025

DESCRIPCION GENERAL			
MARCA	DESCRIPCION	MODELO	CONDICIONES TECNICAS
BEXT	Transmisor	XT150	REGULAR
OPENBOX	Receptor	X4 PLUS	BUENO
TZ	Torre	TZ30	BUENA
Antena FM	Antena	YAGI LINEAL	BUENA
DESCRIPCION DE SITIO			

Equipo estaba funcional, pero se encontraba con temperatura alta.

Aire acondicionado trabajando en óptimas condiciones.

Torre y tensores se encuentran en buen estado.

Antena parabólica se encuentra en buenas condiciones un poco rasgada.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se le cambio el abanico al transmisor.

Se revisaron todas las conexiones.

Se le dio su mantenimiento preventivo al transmisor.

La señal quedo al aire.

FUNCIONAMIENTO POSTERIOR

El equipo transmisor quedo funcional y transmitiendo.



El reflejo del equipo es 6 watts.

Conexiones en condiciones buenas.

Antena en buenas condiciones.

Ing. Fernando Ornelas

Ing. Jorge Durazo

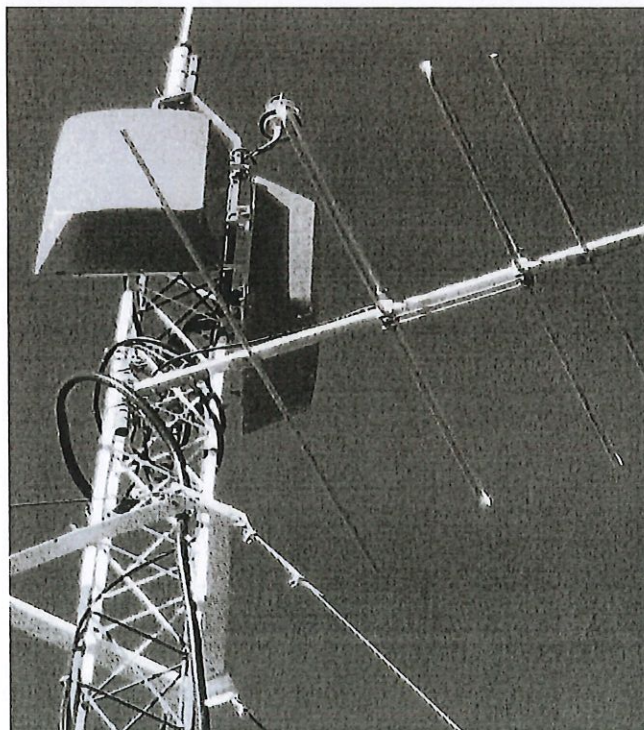
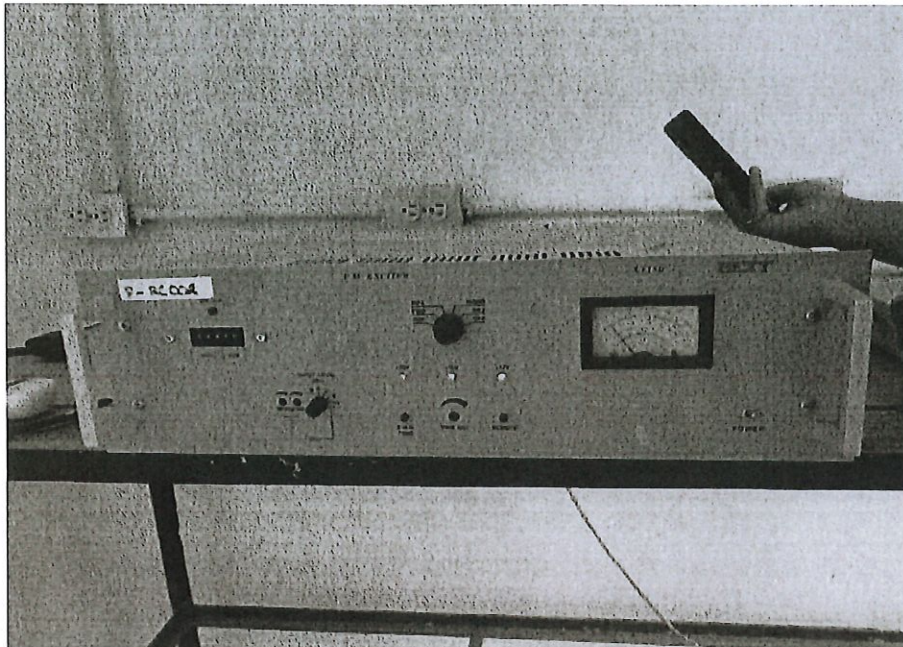


Ing. Fernando Ornelas

Fernando Ornelas

Ing. Jorge Durazo

Jorge Durazo

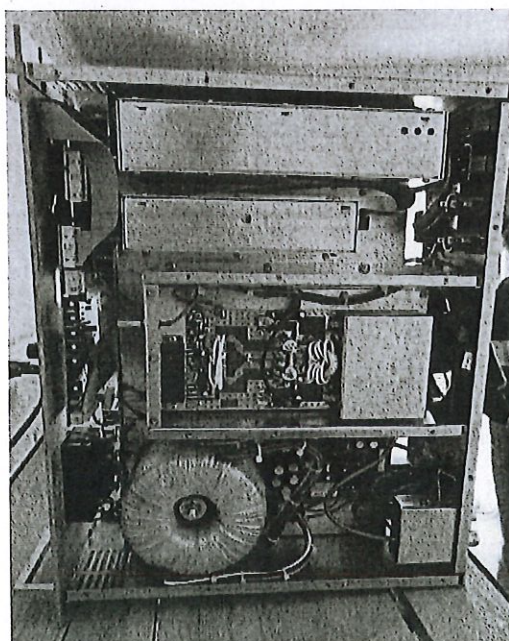
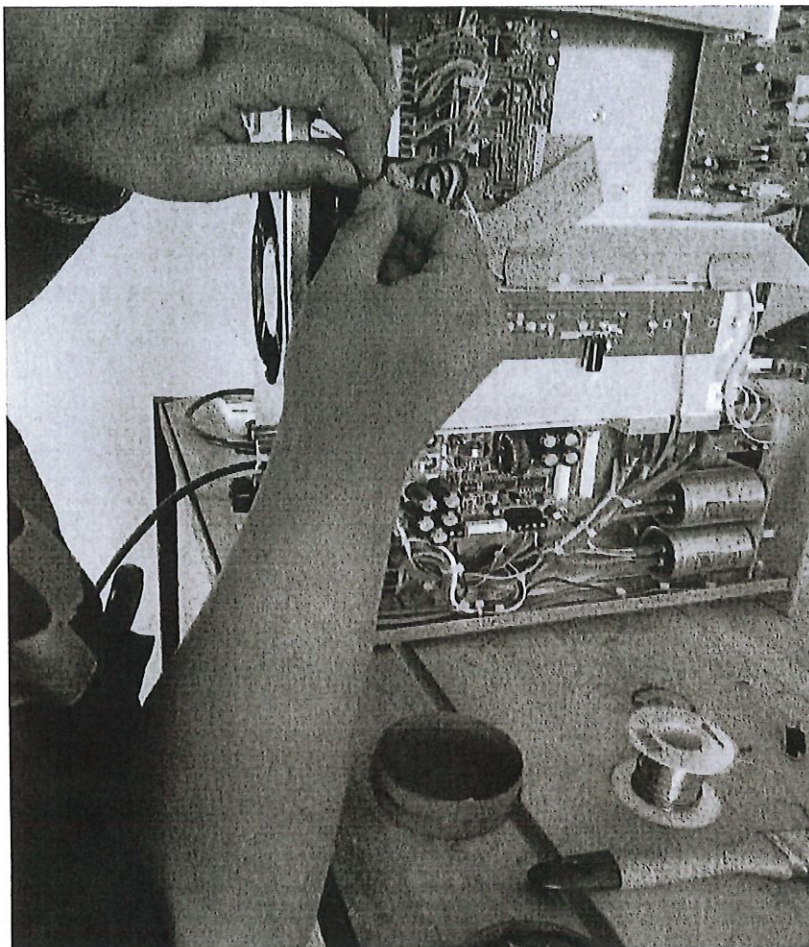


Ing. Fernando Ornelas

Fernando Ornelas

Ing. Jorge Durazo

Jorge Durazo

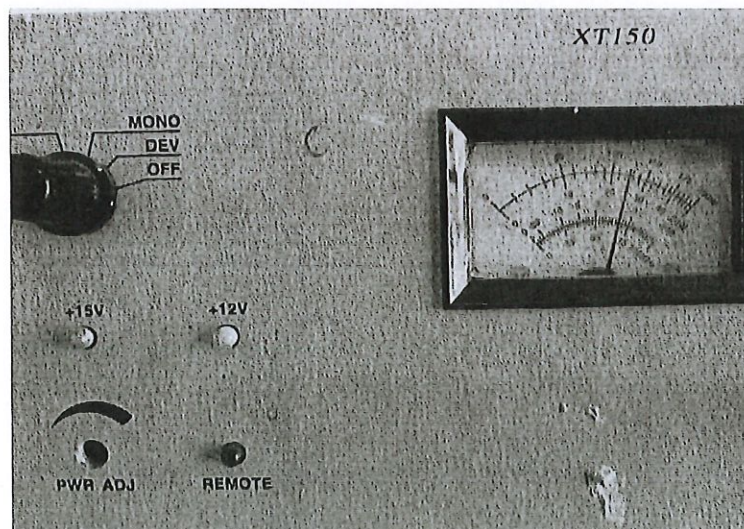
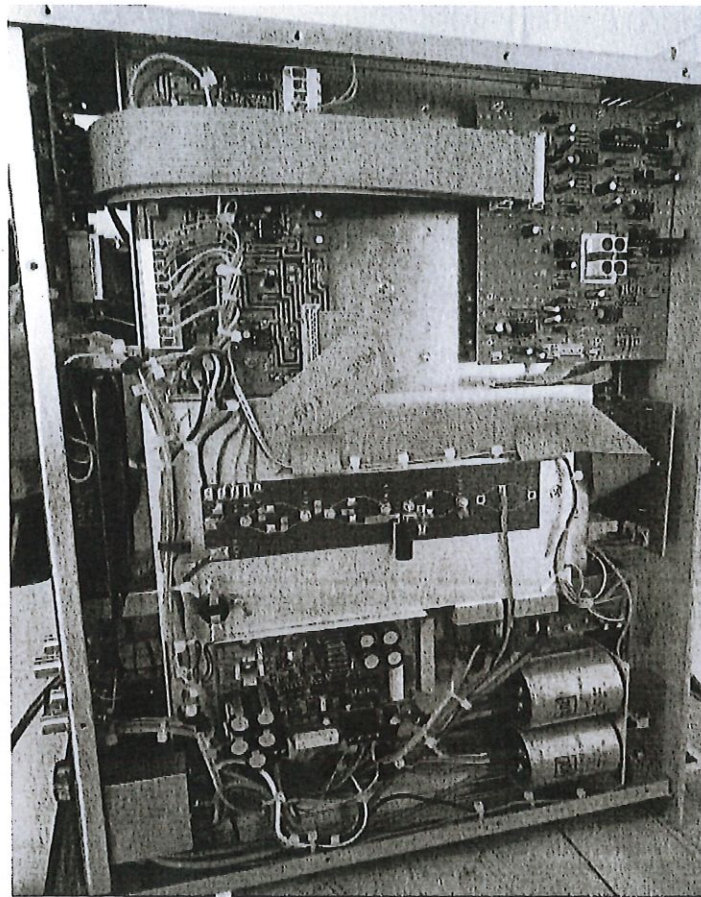


Ing. Fernando Omelas

Fernando Omelas

Ing. Jorge Durazo

Jorge Durazo

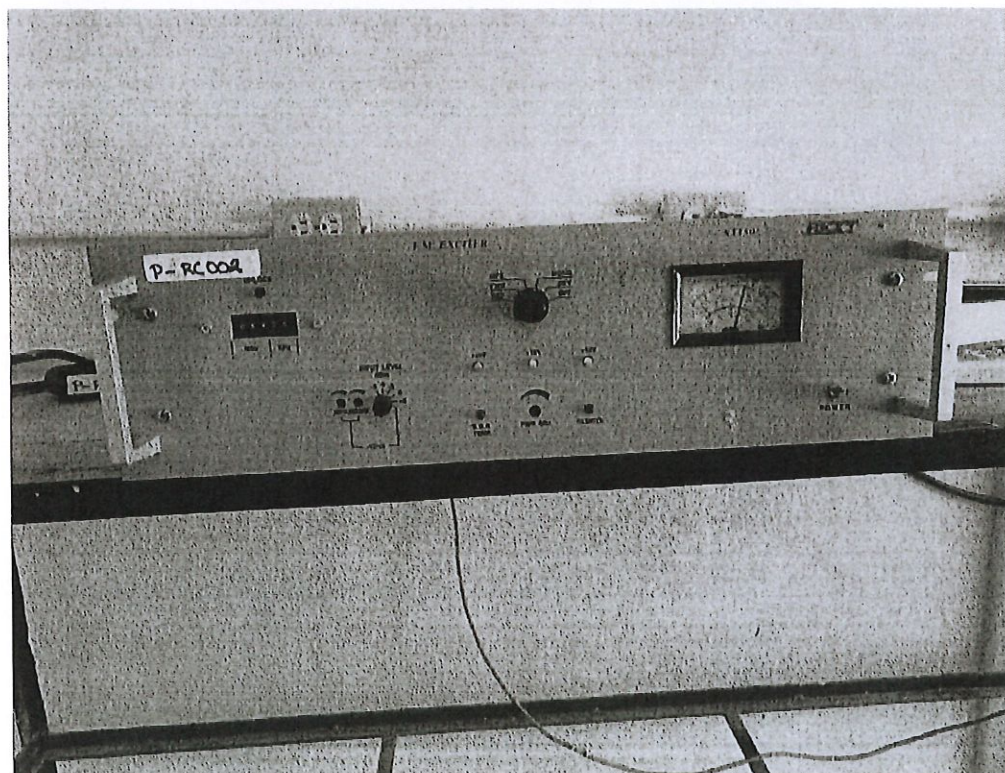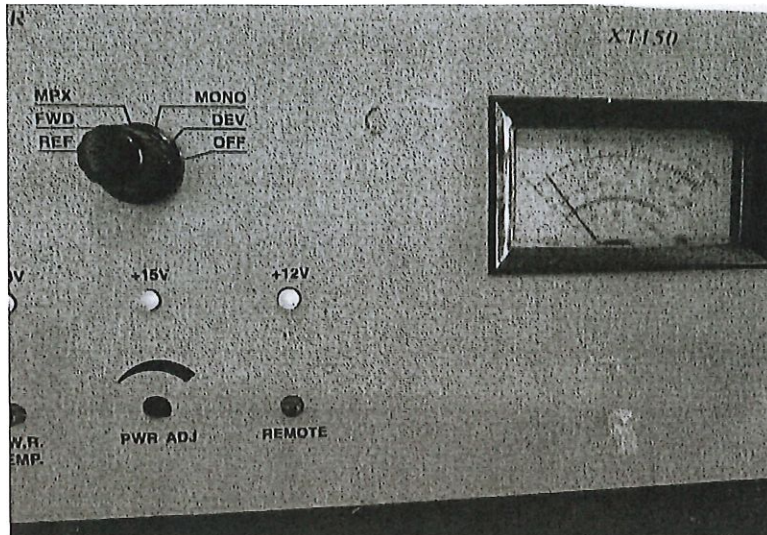

Ing. Fernando Ornelas

Fernando Ornelas

Ing. Jorge Durazo

Jorge Durazo



Ing. Fernando Ornelas

Fernando Ornelas

Ing. Jorge Durazo

Jorge Durazo

RADIO SONORA

DEPARTAMENTO TECNICO

FORMATO DE INSPECCION GENERAL EN SITIO

DATOS GENERALES: BACERAC

DD: 22

MM:04

AA: 2025

DESCRIPCION GENERAL

MARCA	DESCRIPCION	MODELO	CONDICIONES TECNICAS
NICOM	Transmisor	NTi	REGULAR
OPENBOX	Receptor	X4 PLUS	BUENO
TZ	Torre	TZ30	MALA
Antena FM	Antena	YAGI	BUENA

DESCRIPCION DE SITIO

Equipo se encontraba apagado.

Aire acondicionado trabajando en óptimas condiciones.

Torre se encuentra en muy mala condición fisurada.

Antena parabólica se encuentra en buenas condiciones.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se le hizo una reparación al equipo transmisor para que prendiera.

Se revisaron las conexiones coaxiales y de audio se cambió un conector RCA y un coaxial.

Se direcciono la parábola para tener una mejor calidad y señal de satélite.

La señal quedo intermitente debido al LNB malas condiciones.

FUNCIONAMIENTO POSTERIOR

El equipo transmisor quedo funcional, pero se corta señal por mal funcionamiento del LNB.



El reflejo del equipo es 0 watts.

Conexiones en condiciones buenas.

Antena en buenas condiciones.


Ing. Fernando Oñelas

Ing. Jorge Durazo

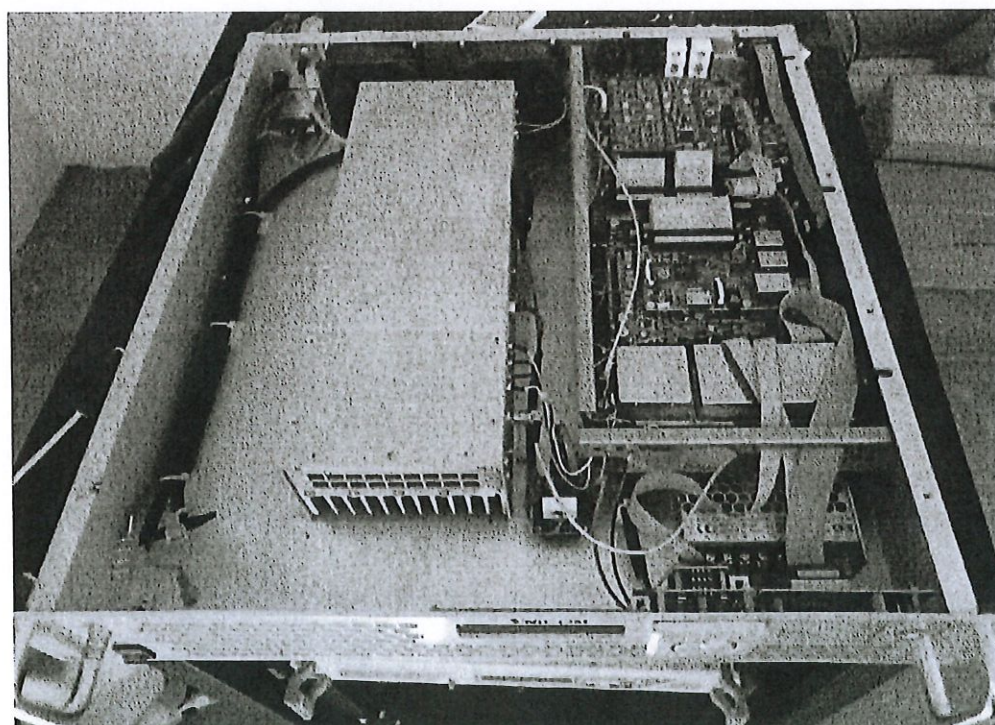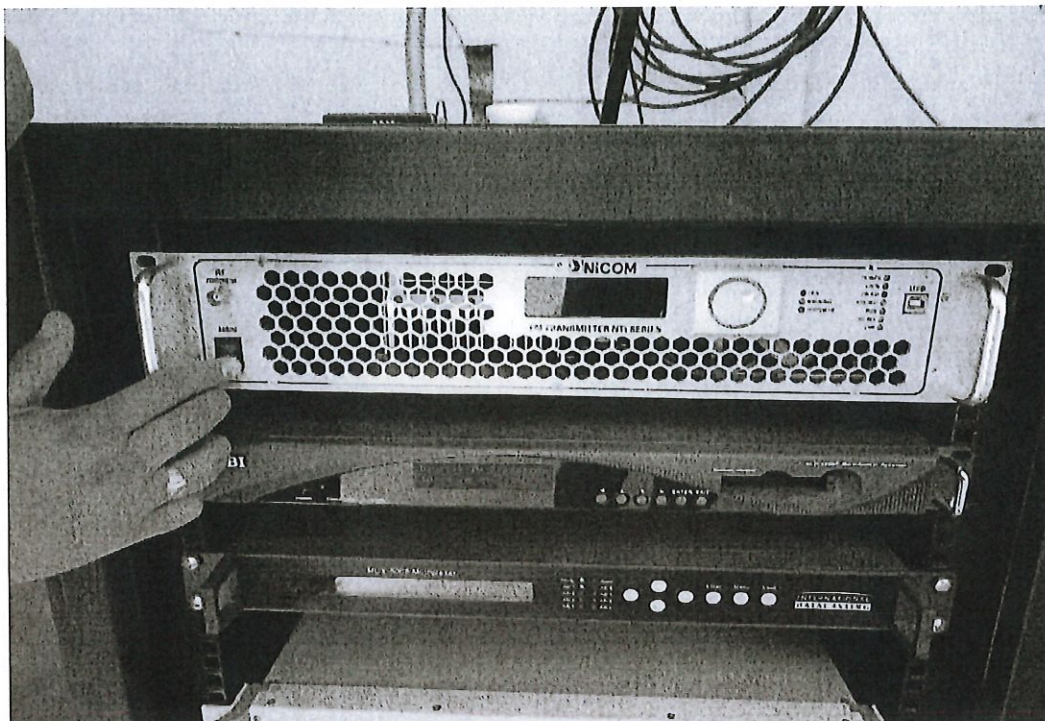

Ing. Fernando Ornelas

Ing. Jorge Durazo

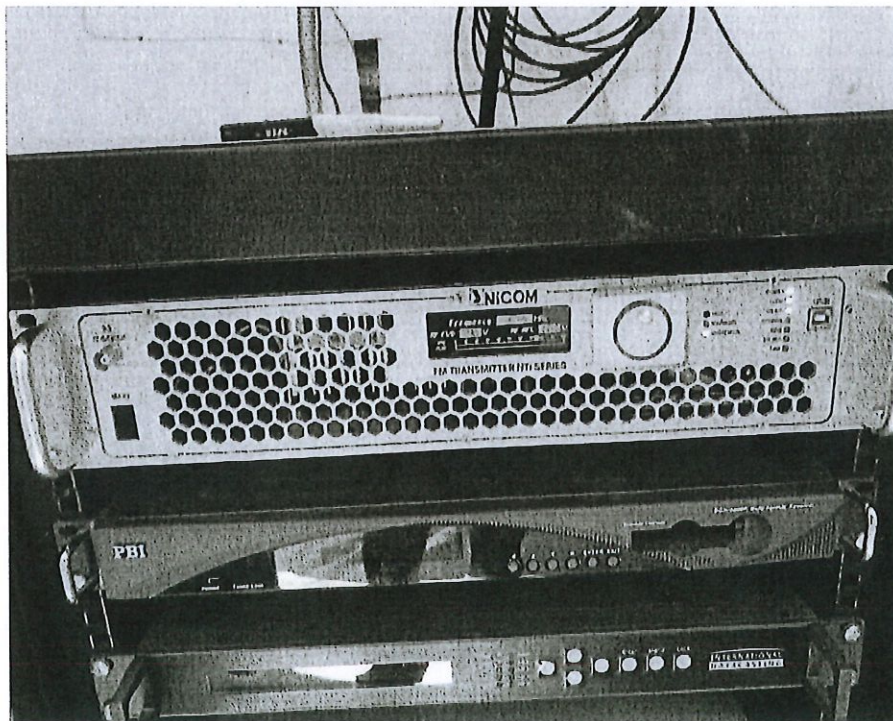


Ing. Fernando Ornelas


Ing. Jorge Durazo




Ing. Fernando Ornelas


Ing. Jorge Durazo

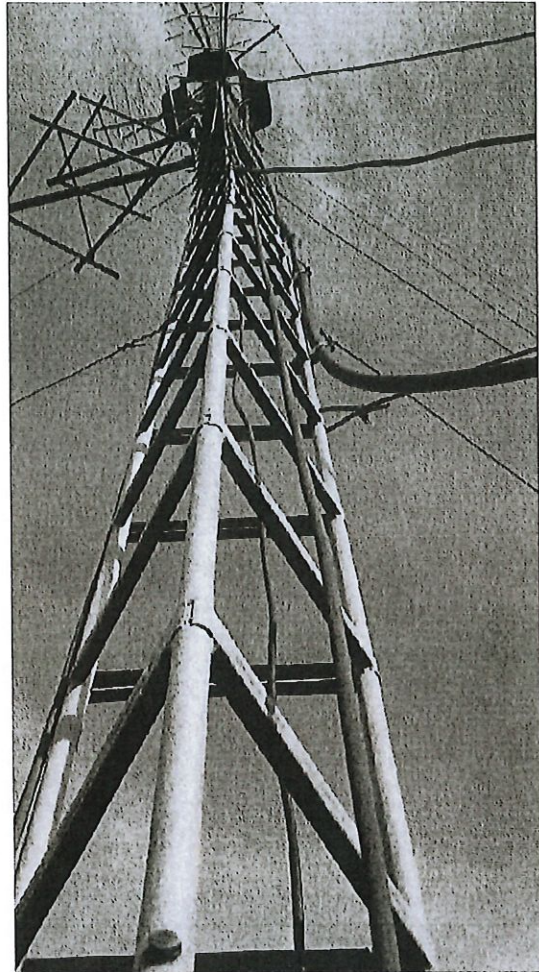Ing. Fernando Ornelas

Fernando Ornelas

Ing. Jorge Durazo

Jorge Durazo
