



RADIO SONORA
Oficio de Comisión

Hermosillo, Sonora, 13 de mayo del 2025.

C. VILLARREAL ANDUAGA DANIEL ANTONIO
DIRECTOR TECNICO
Presente.

Por medio del presente se le comisiona para que en representación de Radio Sonora realice lo siguiente:

Objetivo o Propósito de la comisión:

Visita de trabajo para atender la repetidora de Magdalena, con el fin de realizar los trabajos de mantenimiento correctivo, dado que se reporta sin señal.

Lugar a donde es comisionado:

Magdalena, Sonora

Periodo que comprende la comisión:

Del 13 y 14 de mayo de 2025


Lic. Tirso Amante Jerez
Director General de Radio Sonora



RADIO SONORA
Gobierno del Estado de Sonora



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO



RADIO SONORA

DEPARTAMENTO TECNICO

FORMATO DE INSPECCION GENERAL EN SITIO

DATOS GENERALES: MAGDALENA		
DD: 13,14	MM:05	AA: 2025

DESCRIPCION GENERAL			
MARCA	DESCRIPCION	MODELO	CONDICIONES TECNICAS
BEXT	Transmisor	XT150	REGULAR
TORRE	Arriostrada	TZ30	NUEVA
OPENBOX	Receptor	X4 PLUS	BUENA
ANTENA FM	ANTENA	YAGI	REGULAR
DESCRIPCION DE SITIO			

El equipo se encontró encendido transmitiendo al aire se entrecortaba en momentos.

No hay aire acondicionado será remplazado por Telexmax.

Torre esta nueva.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Servicio preventivo a equipos de telecomunicaciones, se remplazó un gajo de la parábola.

Inspección visual de los dispositivos de sitio, limpieza de sitio.

Revisión de cableado eléctrico, RG8, audio y Coaxial se encuentran en condiciones regulares no se hizo ningún cable nuevo.

El equipo estaba presentando mucho reflejo debido a que la antena quedo instalada a poca altura, queda pendiente subirla para mejorar funcionamiento. No se pudo hacer el trabajo debido a condiciones inseguras (fuertes vientos).

FUNCIONAMIENTO POSTERIOR




El equipo presenta una potencia de 120 watts

El reflejo del equipo es de 17 watts.

Quedo al aire.



Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas

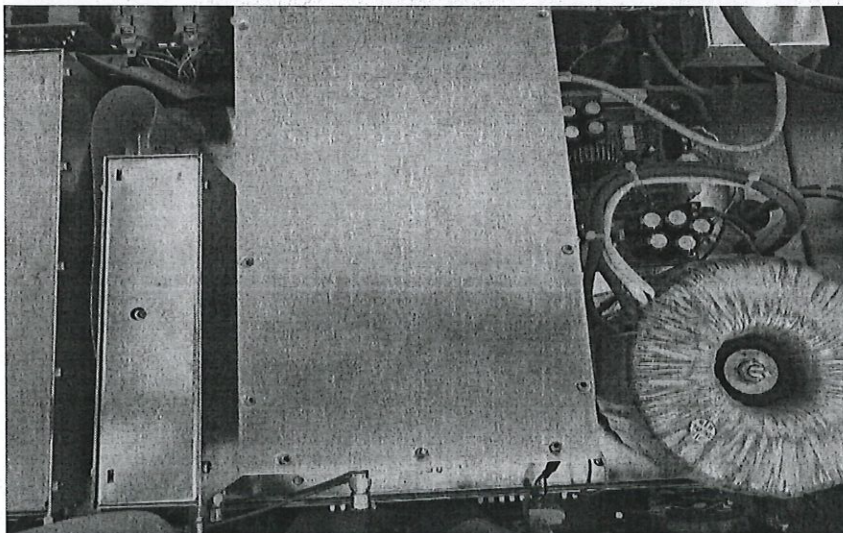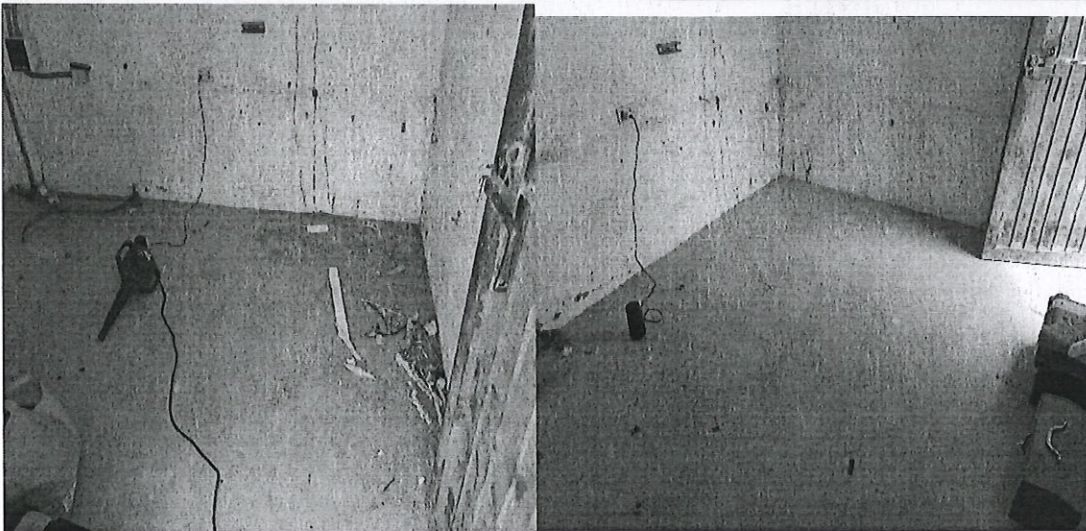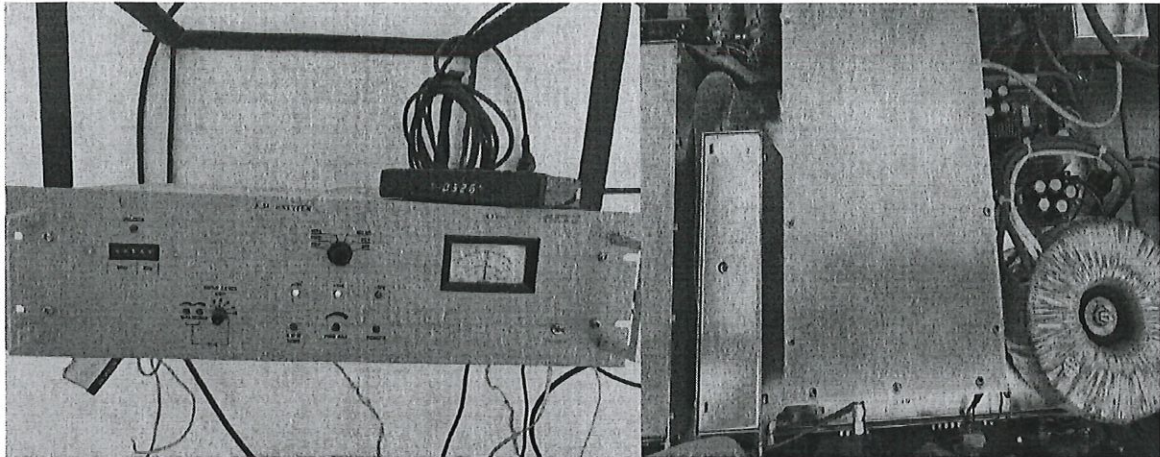




Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas

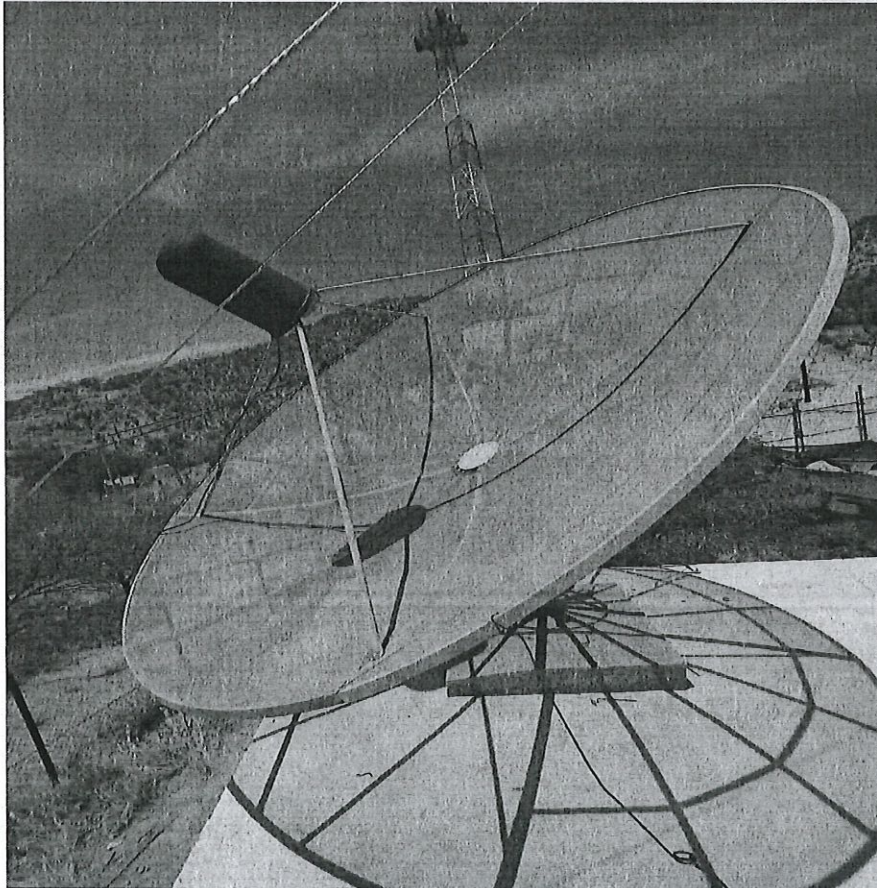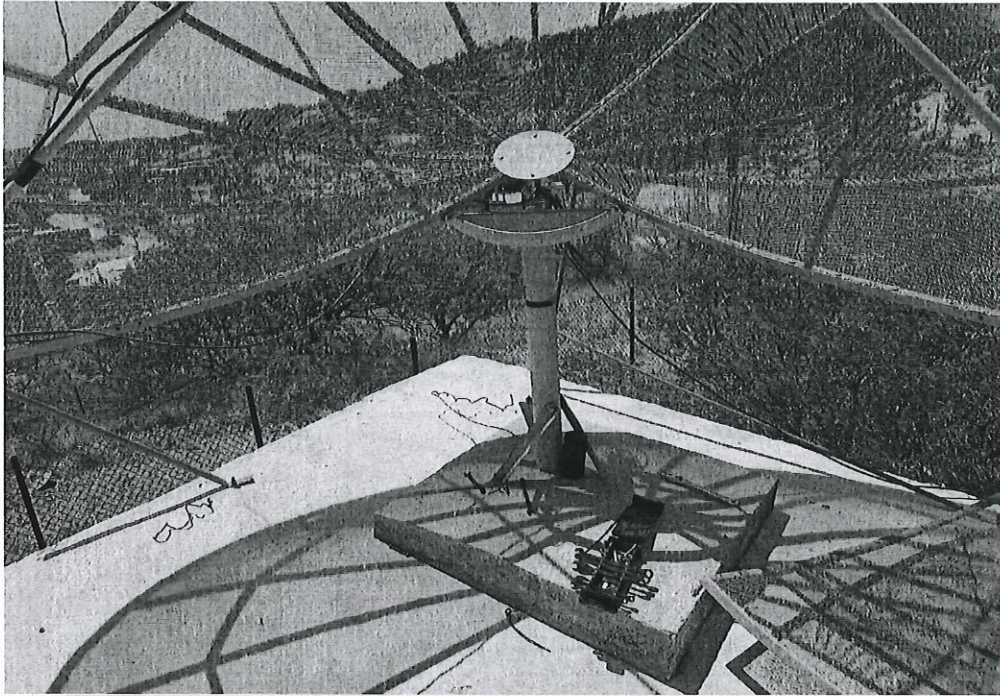

Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas

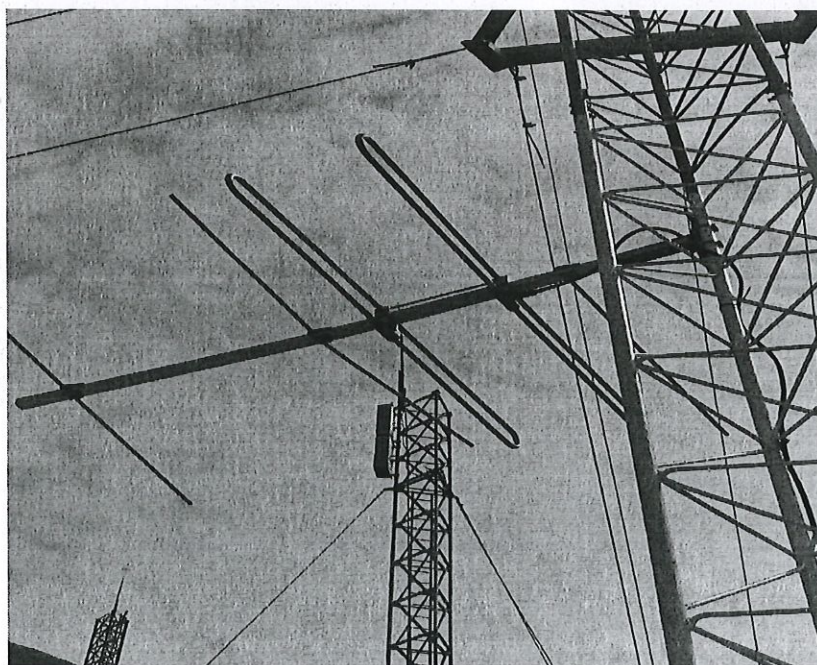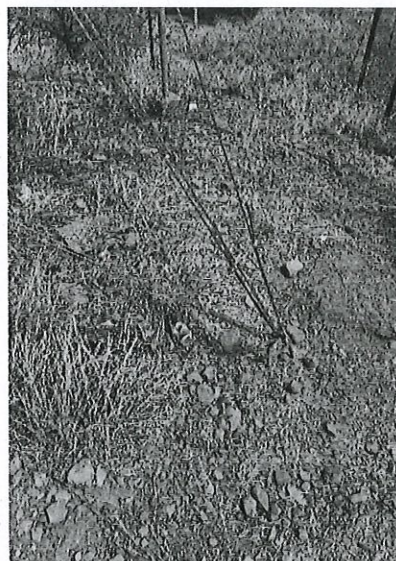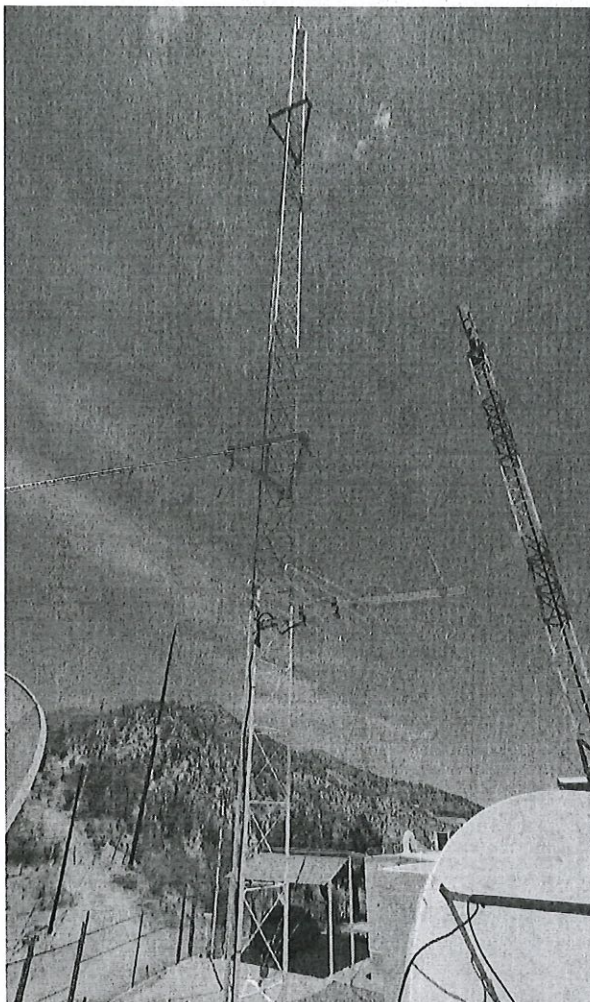

Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas
