



RADIO SONORA
Oficio de Comisión

Hermosillo, Sonora, 24 de septiembre de 2024.

C. FERNANDO DANIEL ORNELAS LOYA
TECNICO EN MANTENIMIENTO
Presente.

Por medio del presente se le comisiona para que en representación de Radio Sonora realice lo siguiente:

Objetivo o Propósito de la comisión:

Visita de trabajo en las que se atenderán las repetidoras de Carbo, Santa Ana, Imuris y Cananea, con el fin de realizar trabajos correctivos y preventivos, ya que se reportan fuera del aire.

Lugar a donde es comisionado:

Carbo, Santa Ana, Imuris y Cananea

Periodo que comprende la comisión:

25 y 27 de septiembre de 2024

H. AYUNTAMIENTO
CANANEA, SONORA.
Comunicación
Social



SECRETARÍA MUNICIPAL
CARBÓ, SONORA.
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

Lic. Tirso Amante Jerez
Director General de Radio Sonora



RADIO SONORA
Gobierno del Estado de Sonora



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CANANEA, SONORA



RADIO SONORA

DEPARTAMENTO TECNICO

FORMATO DE INSPECCION GENERAL EN SITIO

DATOS GENERALES: CANANEA

DD: 25

MM: 09

AA: 2024

DESCRIPCION GENERAL

MARCA	DESCRIPCION	MODELO	CONDICIONES TECNICAS
Bext	Transmisor	FR 500	REPARADO
Nicom	Excitador	NT 20	NO SIRVE
OpenBox	Receptor	X4 PLUS	BUENO
TZ	Torre	TZ30	REGULAR
Antena FM	Antena		REGULAR
Rheem	Aire acondicionado		BUENO

DESCRIPCION DE SITIO

El equipo se encontró apagado debido a problemas del excitador

Aire acondicionado funcionando de manera optima

Torre se encuentra en buen estado

ACTIVIDADES REALIZADAS

Revisión del excitador para intentar reparar el equipo, encontrándose este quemado.

Inspección visual de los dispositivos de sitio

FUNCIONAMIENTO POSTERIOR

El equipo quedo apagado e incompleto


Conexiones en condiciones regulares

Antena condiciones regulares



Ing. Daniel Villarreal



Ing. Fernando Ornelas



H/24
105

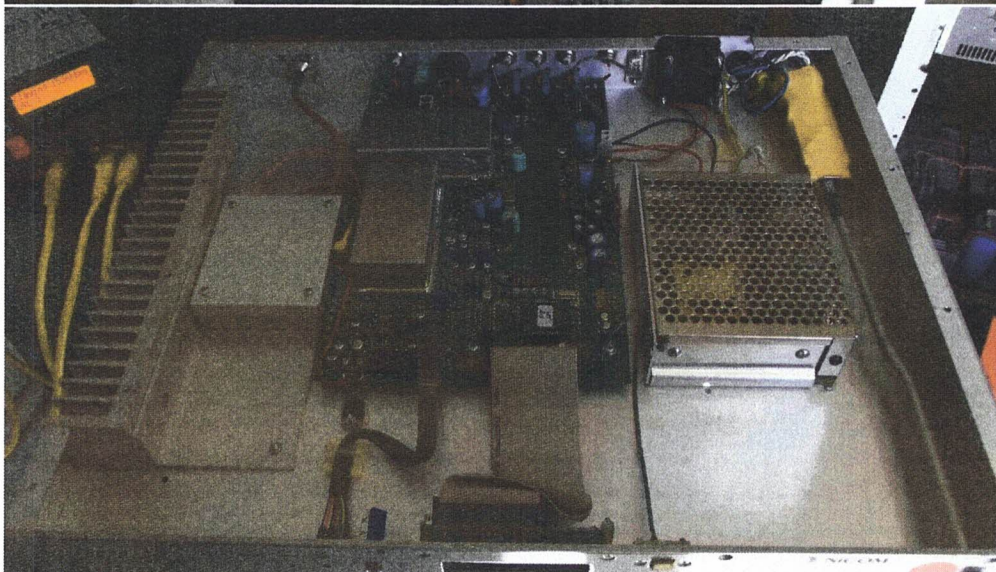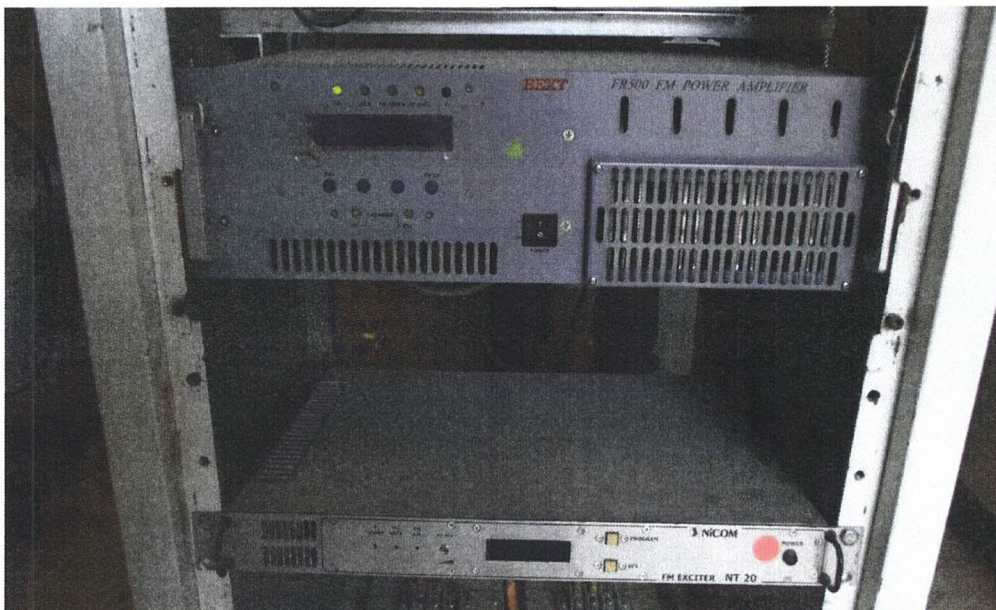

Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas



Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas



Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas



Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas

RADIO SONORA

DEPARTAMENTO TECNICO

FORMATO DE INSPECCION GENERAL EN SITIO

DATOS GENERALES: CARBO

DD: 27

MM: 09

AA: 2024

DESCRIPCION GENERAL

MARCA	DESCRIPCION	MODELO	CONDICIONES TECNICAS
Bext	Transmisor	EZ30	REPARADO
OpenBox	Receptor	X4 PLUS	BUENO
TZ	Torre	TZ30	REGULAR
Antena FM	Antena		REGULAR

DESCRIPCION DE SITIO

El equipo se encontró apagado debido a problemas de electricidad

Cables arrancados y tubo de recepción de CFE doblado

Aire acondicionado sin funcionar de manera optima

Torre se encuentra condiciones regulares

ACTIVIDADES REALIZADAS

Revisión de caja de medidor de electricidad y cableado

Informar al ayuntamiento de lo ocurrido en la repetidora

Inspección visual de los dispositivos de sitio

FUNCIONAMIENTO POSTERIOR

El equipo quedo apagado


Conexiones en condiciones regulares

Antena condiciones regulares

Ing. Daniel Villarreal




Ing. Fernando Ornelas






Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas

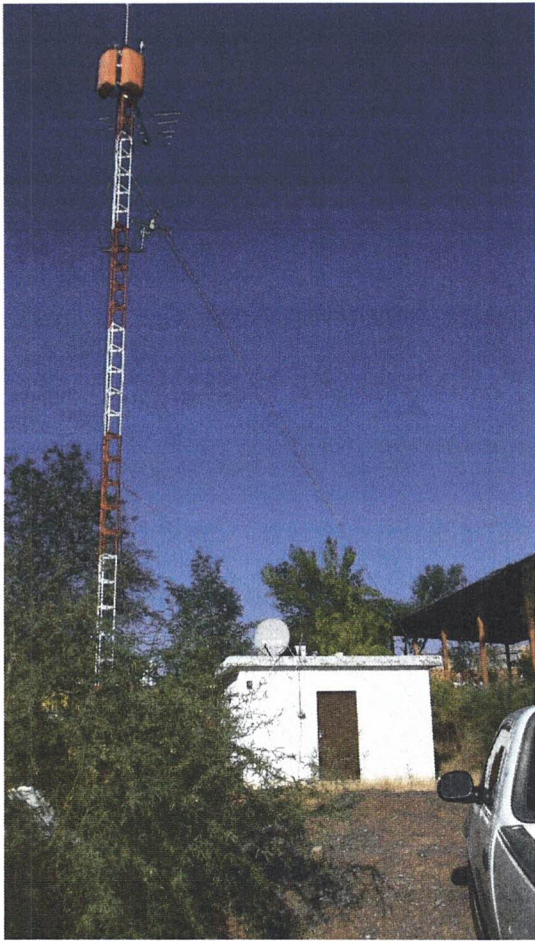


Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas

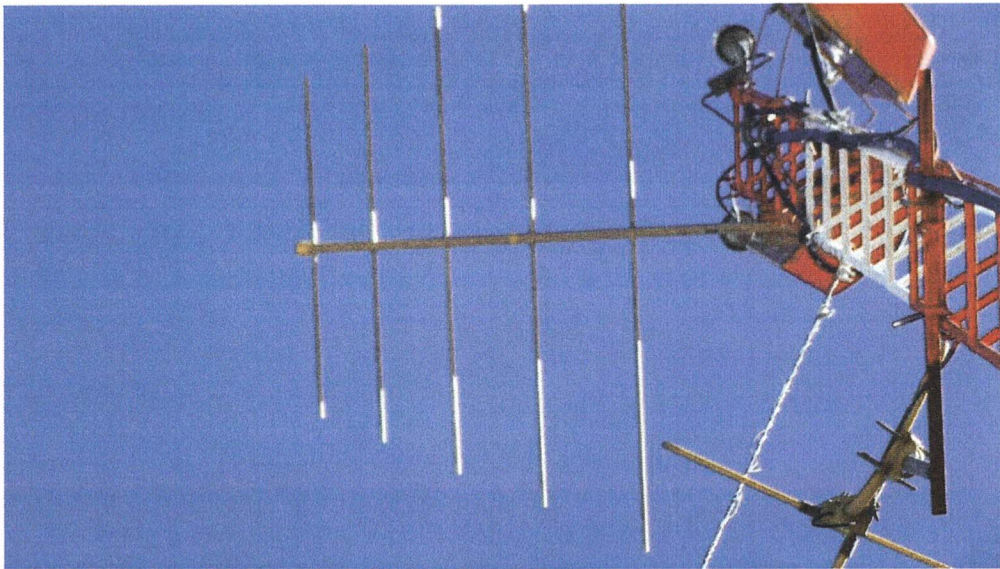

Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas

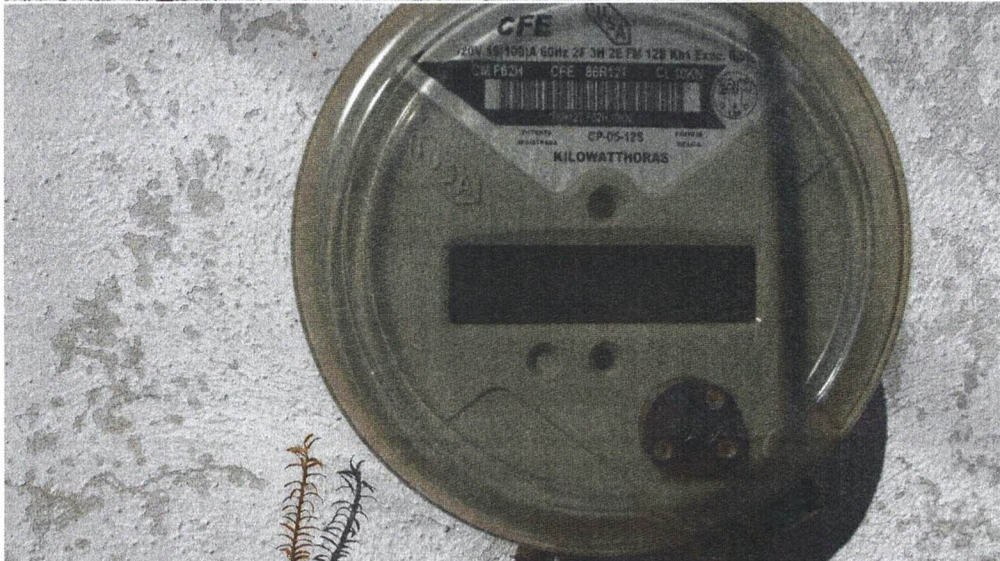

Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas

RADIO SONORA

DEPARTAMENTO TECNICO

FORMATO DE INSPECCION GENERAL EN SITIO

DATOS GENERALES: SANTA ANA

DD: 26

MM: 09

AA: 2024

DESCRIPCION GENERAL

MARCA	DESCRIPCION	MODELO	CONDICIONES TECNICAS
Bext	Transmisor	XT 150	REPARADO
OpenBox	Receptor	X4 PLUS	BUENO
TZ	Torre	TZ30	REGULAR
Fagsa	Antena		MALO

DESCRIPCION DE SITIO

El equipo se encontró con alto reflejo debido a la antena

Torre se encuentra en condiciones regulares, asi como los tirantes

ACTIVIDADES REALIZADAS

Servicio preventivo a equipos

Cambio de conector de antena

Inspección visual de los dispositivos de sitio

FUNCIONAMIENTO POSTERIOR

El equipo presenta una potencia de 110 watts

El reflejo del equipo es de 50 watts

Conexiones en condiciones buenas

Antena condiciones malas


Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas




Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas

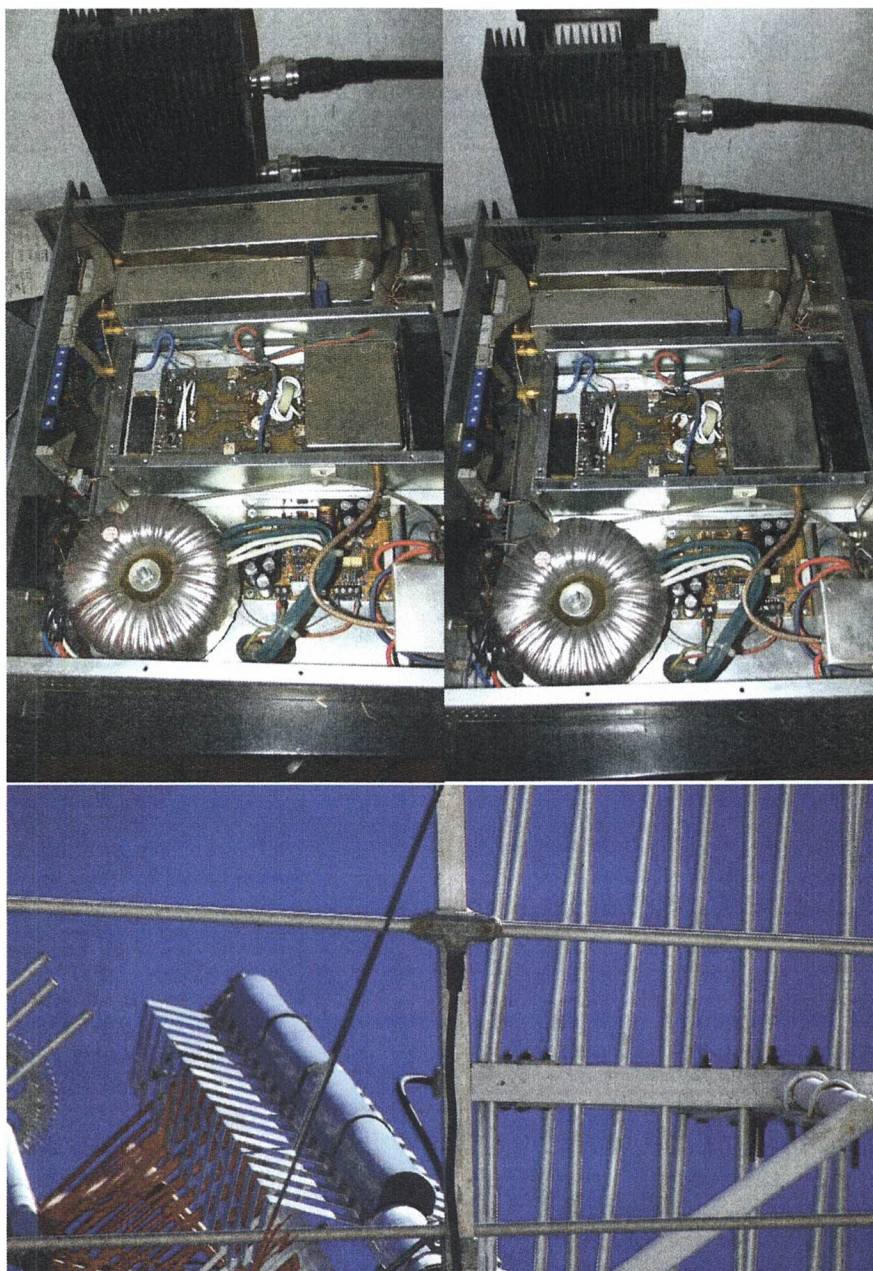

Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas

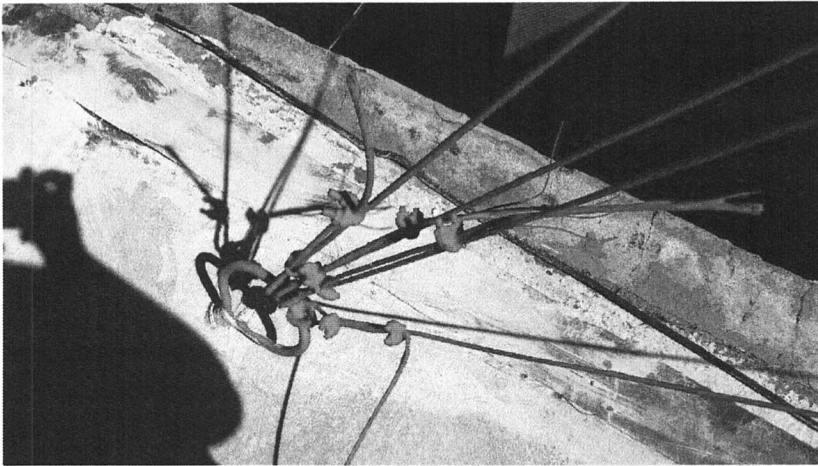

Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas



Ing. Daniel Villarreal

Ing. Fernando Ornelas
