GOBIERNO DE SONORA

RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

Oficio de Comisión

Hermosillo, Sonora, 19 de marzo de 2026

C. FERNANDO DANIEL ORNELAS LOYA
Coordinador de mantenimiento técnico
P r e s e n t e.

Por medio del presente se le comisiona para que en representación de Radio Sonora realice lo siguiente:

Objetivo o Propósito de la comisión:
Realizar un viaje en el cual se visitará el municipio de San Javier, para realizar servicios de mantenimiento preventivo de equipos y que la repetidora se encuentre trabajando óptimamente.

Lugar a donde es comisionado:
San Javier

Periodo que comprende la comisión:
Del 23 de marzo del 2026

Lic. Tirso Amante Jerez
Director General de Radio Sonora

RECIBIDO
PARA SU REVISION
FECHA: 23-marzo-2026
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER, SON.

RADIO SONORA
Gobierno del Estado de Sonora

RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

SONORA
TIERRA DE OPORTUNIDADES

RADIO SONORA

DEPARTAMENTO TECNICO

FORMATO DE INSPECCION GENERAL EN SITIO

DATOS GENERALES: San Javier		
DD: 23	MM: MARZO	AA: 2026

DESCRIPCION GENERAL			
MARCA	DESCRIPCION	MODELO	CONDICIONES TECNICAS
BEXT	Transmisor	LEX 30	MALA
OpenBox	Receptor	X4 PLUS	BUENO
TZ	Torre	TZ 30	REGULAR
Antena FM	Antena		REGULAR
whirlpool	Aire acondicionado		

DESCRIPCION DE SITIO

Aire acondicionado funcionando de manera óptima.

El equipo fue puesto en operación.

Cableado, conexiones de audio y RF en buenas condiciones

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se instalo un equipo transmisor que se llevó del área, pero a los 15 minutos de funcionamiento dejo de transmitir se le hizo una revisión, pero no se pudo dar con el problema el equipo ya cuenta con varias reparaciones és un equipo ya antiguo se retiró de nuevo por falla de Audio.

Se realizo revisión de conexiones, inspección visual en general se hizo una revisión de pruebas operativas a la tarjeta electrónica.

checo el equipo de audio Se retira el transmisor debido a que se requiere revisarlo por falla en chip de audio perdiendo el audio.

FUNCIONAMIENTO POSTERIOR

El equipo se retiró y quedo fuera del aire, se retira para revisión en taller.


Conexiones en condiciones buenas.

Antena condiciones buenas.

Torre condiciones buenas.


Ing. Daniel Villarreal.

Ing. Fernando Ornelas

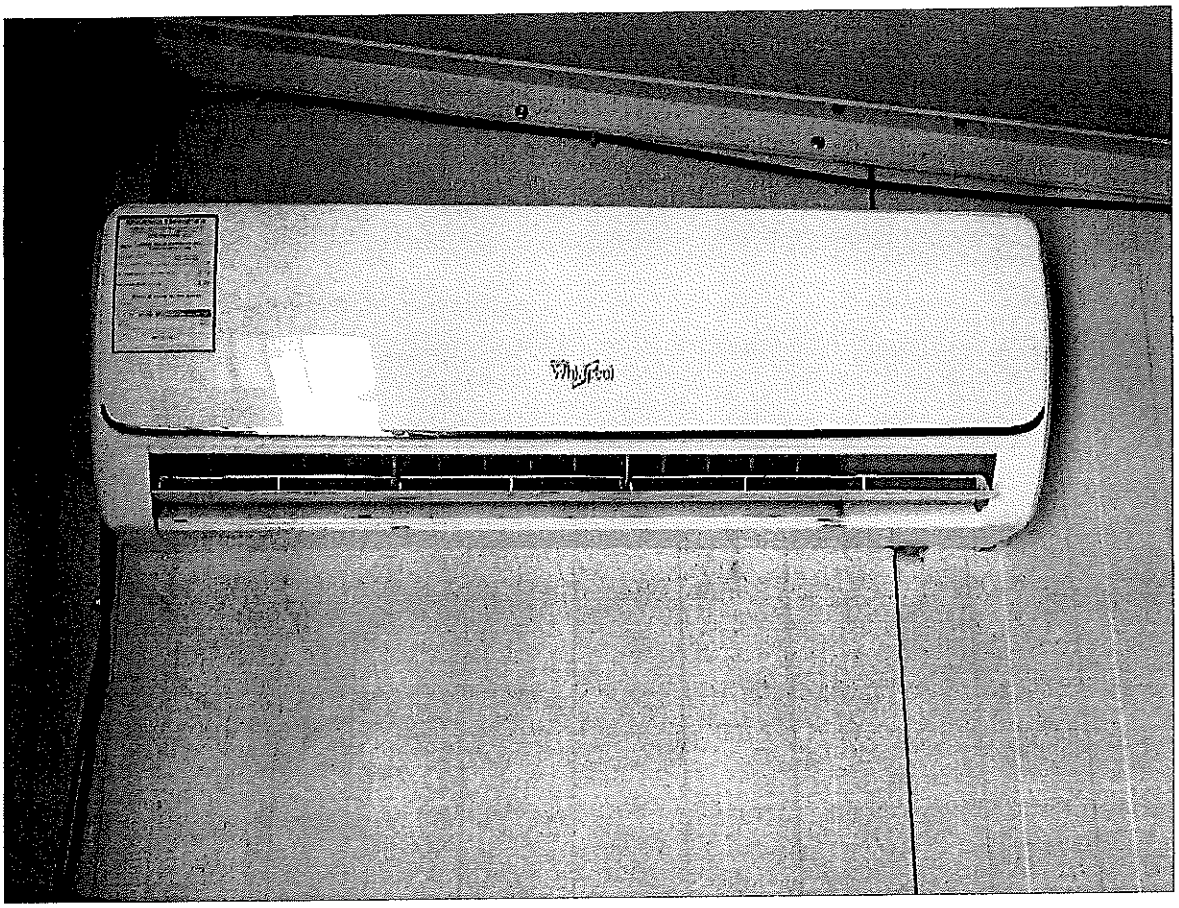


Ing. Daniel Villarreal.

Ing. Fernando Ornelas

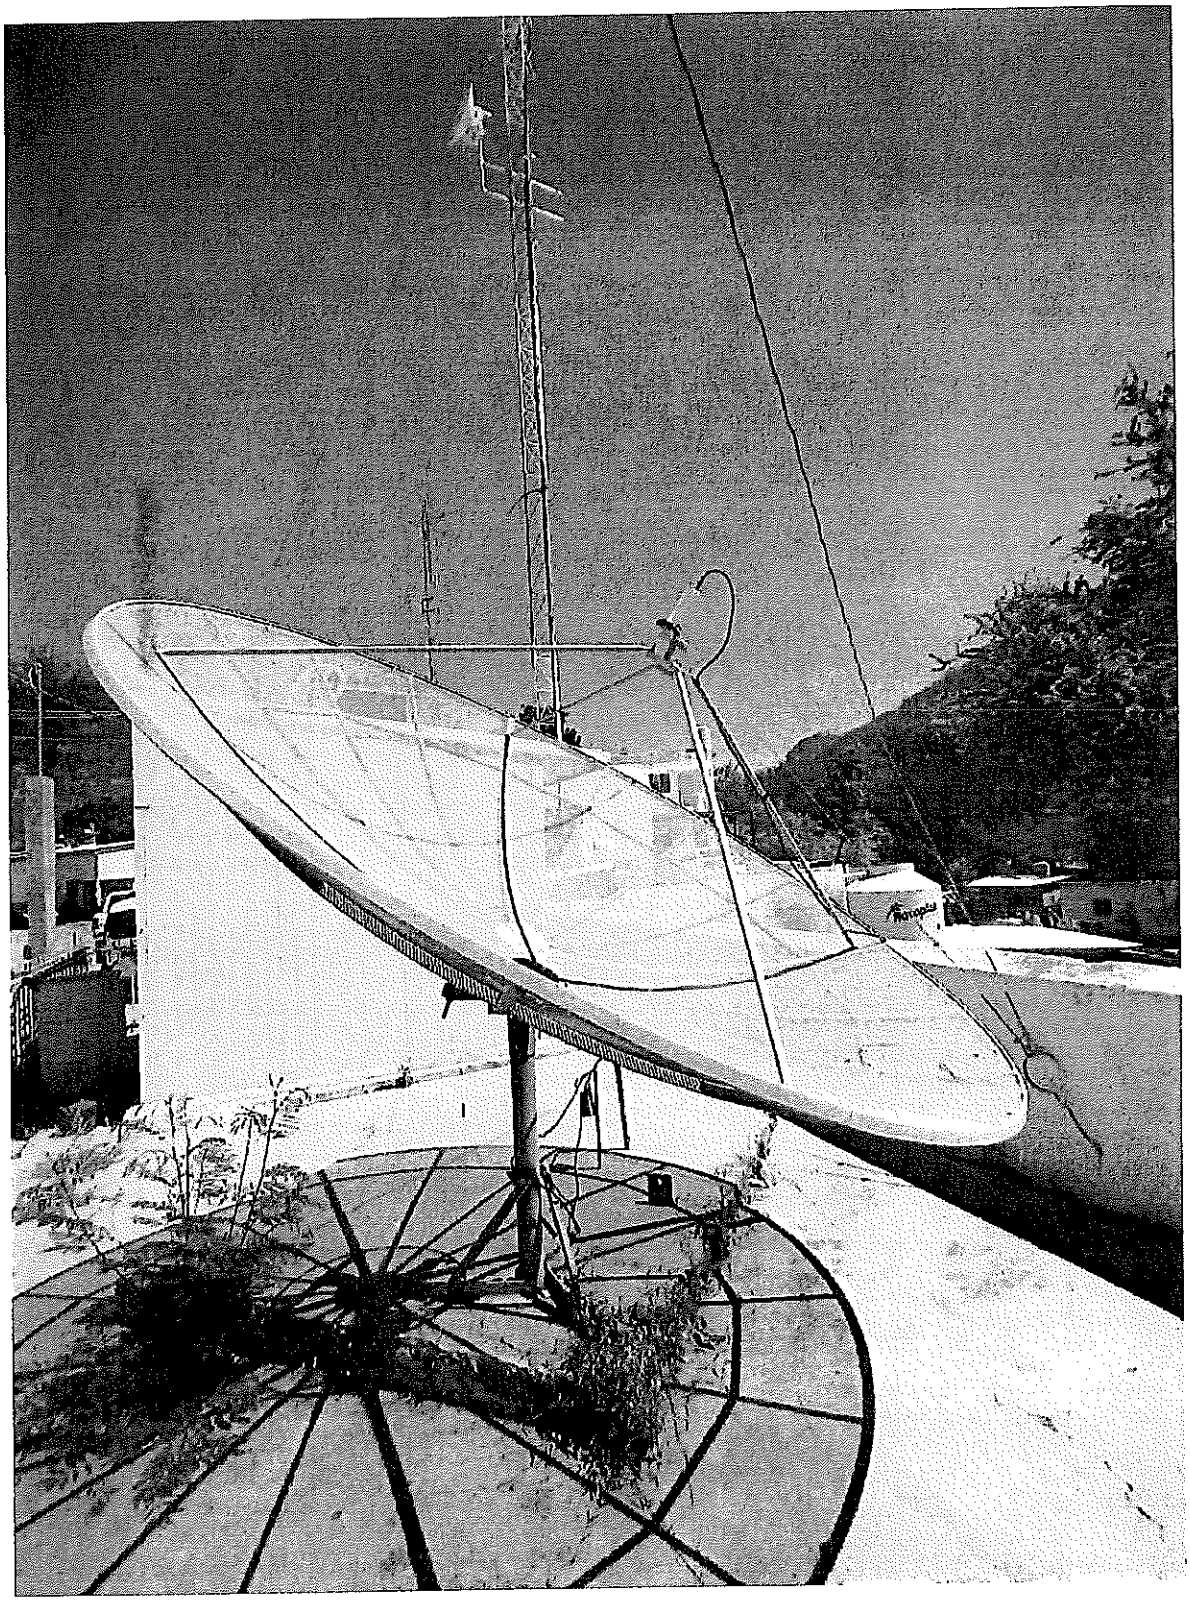

Ing. Daniel Villarreal.

Ing. Fernando Ornelas

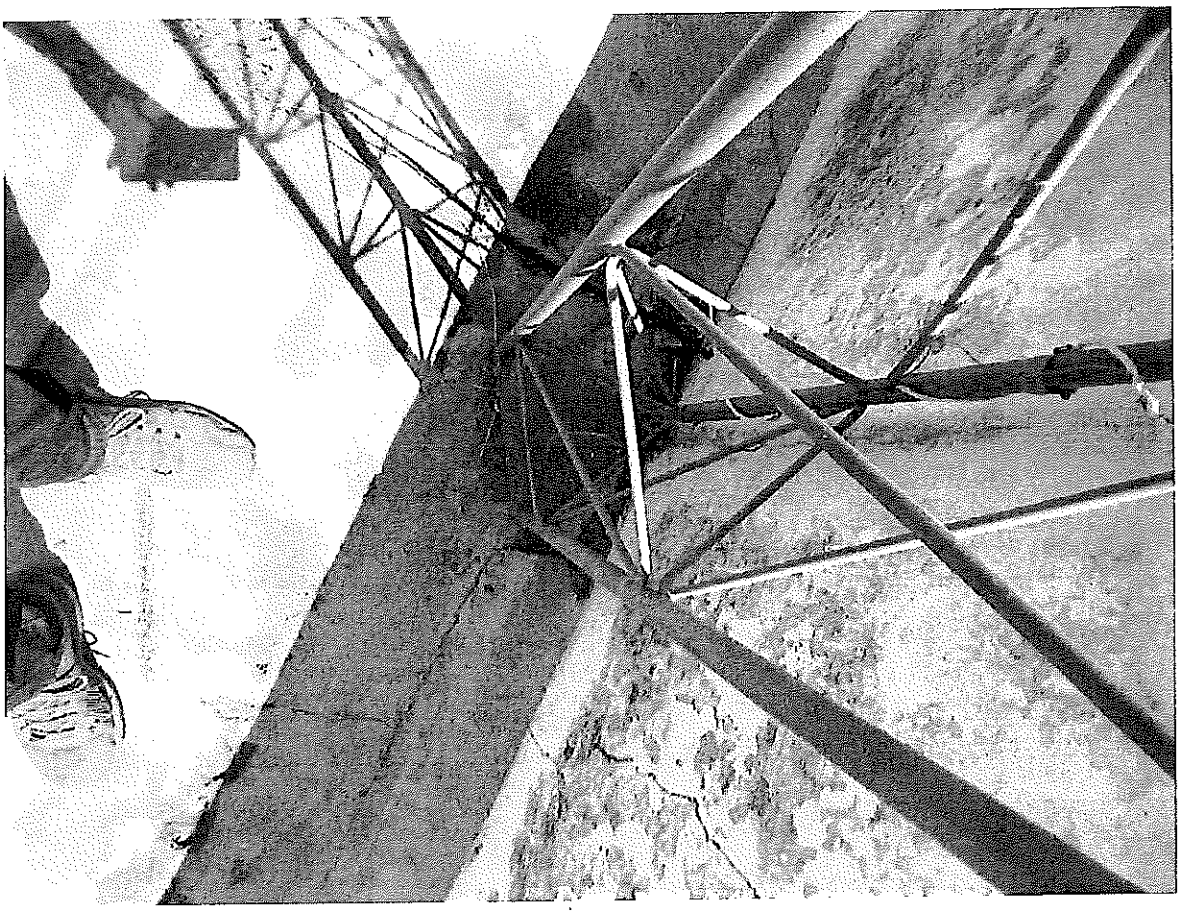

Ing. Daniel Villarreal.


Ing. Fernando Ornelas






Ing. Daniel Villarreal.

Ing. Fernando Ornelas

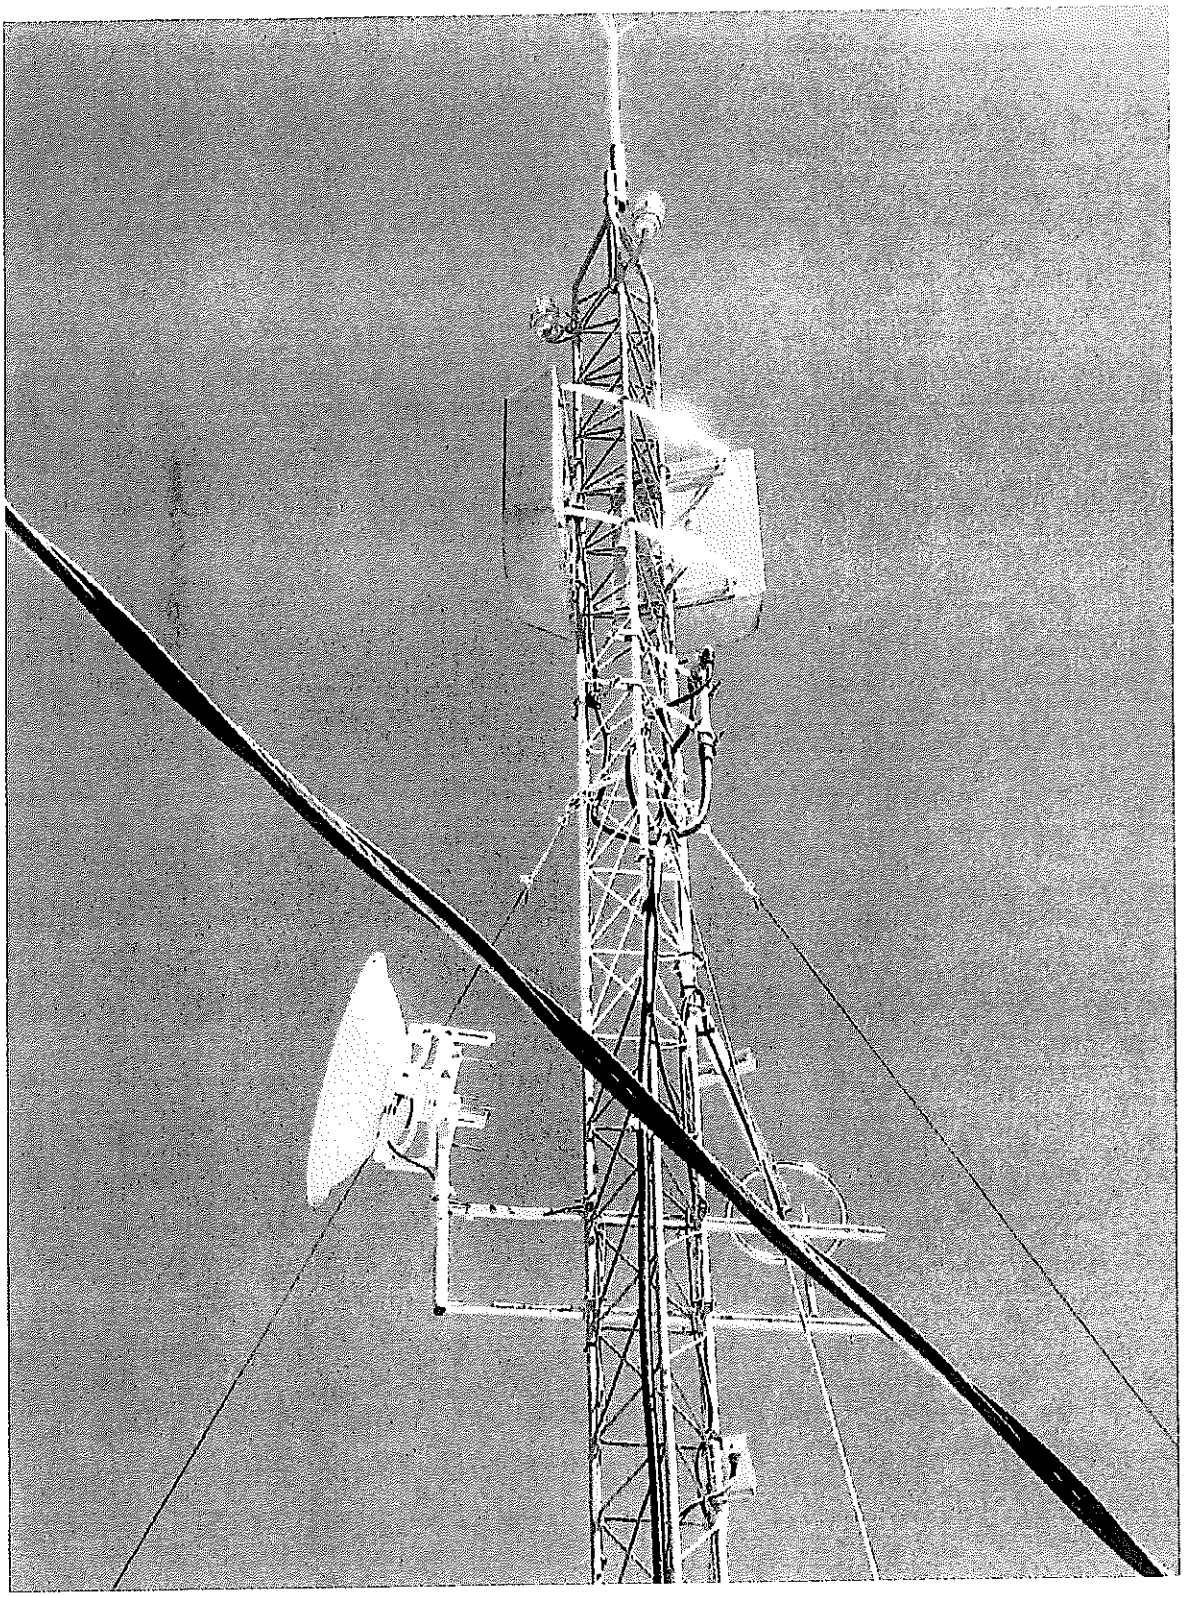


Ing. Daniel Villarreal.

Ing. Fernando Ornelas

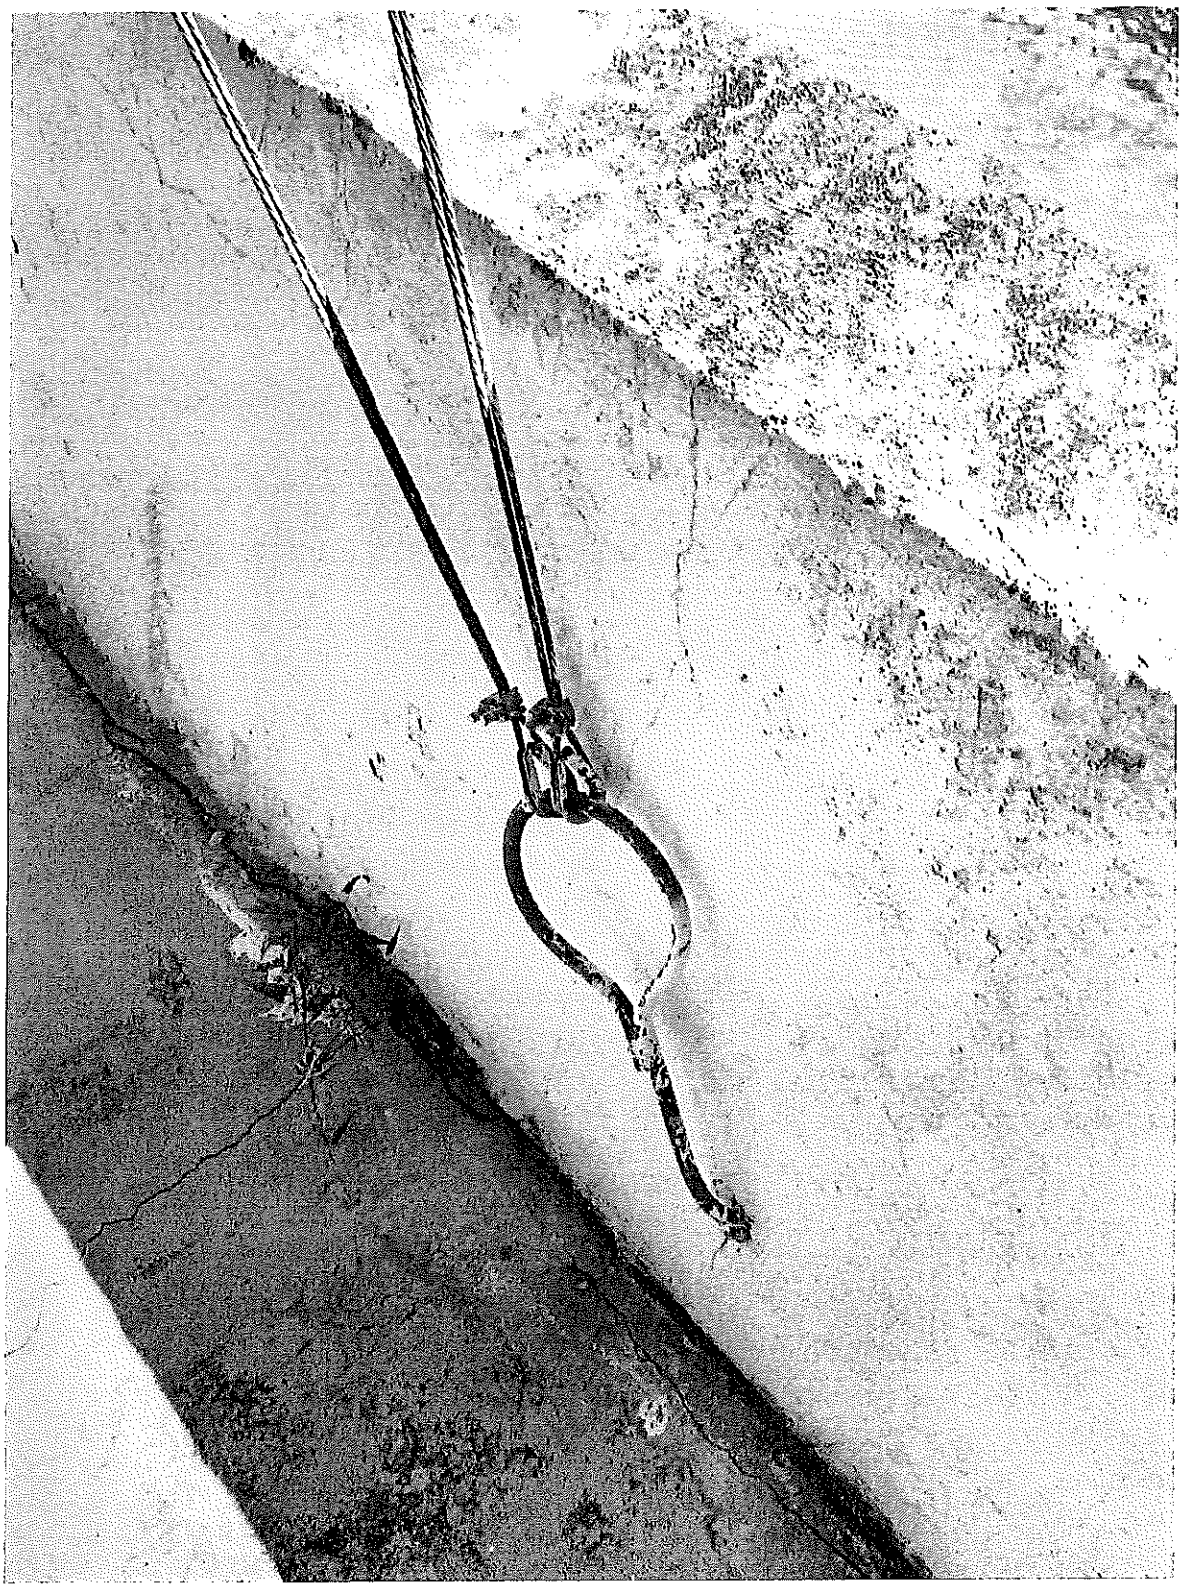

Ing. Daniel Villarreal.

Ing. Fernando Ornelas

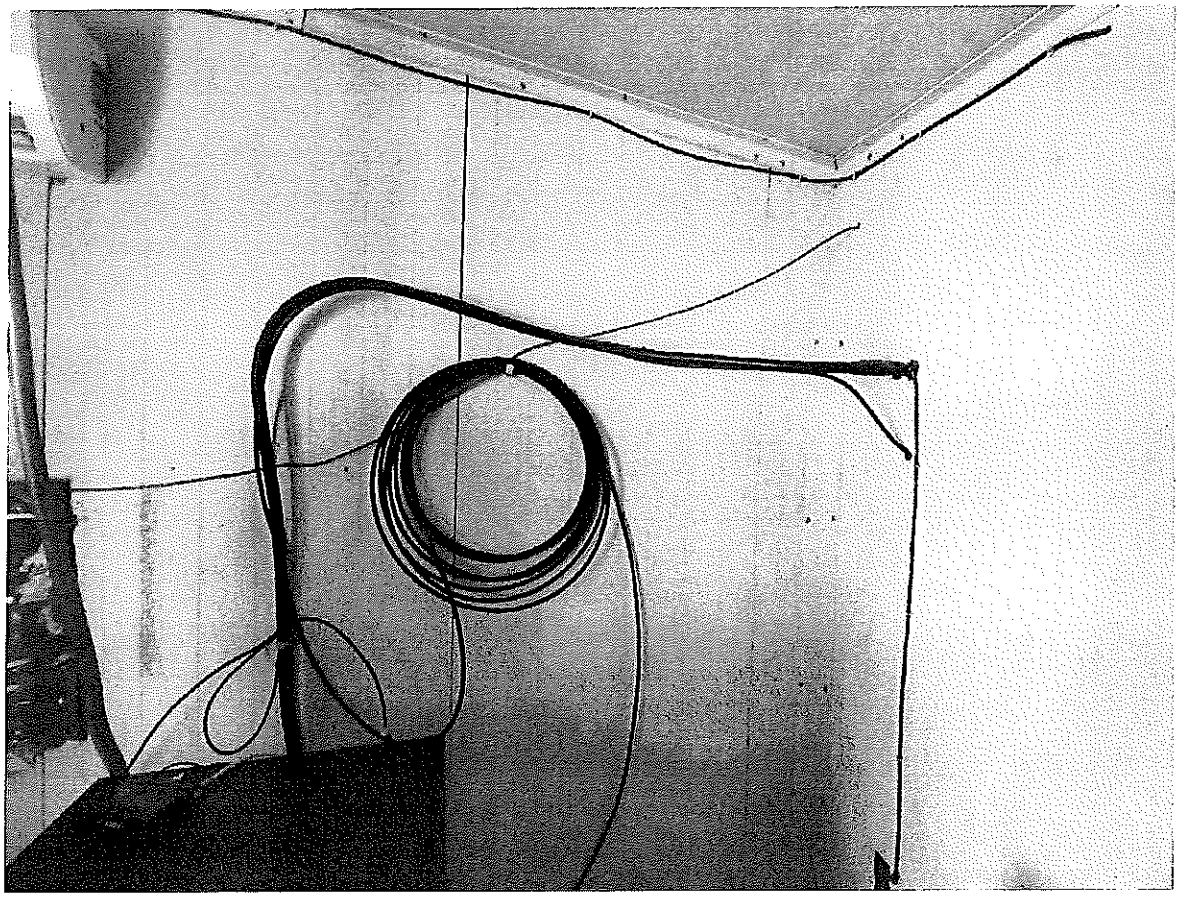

Ing. Daniel Villarreal.

Ing. Fernando Ornelas
