GOBIERNO DE SONORA

RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

Oficio de Comisión

Hermosillo, Sonora, 25 de marzo de 2026

JORGE LUIS GARCIA DURAZO
Técnico en Telecomunicaciones
P r e s e n t e.

Por medio del presente se le comisiona para que en representación de Radio Sonora realice lo siguiente:

Objetivo o Propósito de la comisión:
Realizar un viaje en el cual se visitará el municipio de San Pedro de la cueva y Sahuaripa, para realizar servicios de mantenimiento preventivo de equipos y que la repetidora se encuentre trabajando óptimamente.

Lugar a donde es comisionado:
San Pedro de la cueva y Sahuaripa

Periodo que comprende la comisión:
Del 26 al 27 de marzo del 2026

Lic. Tirso Amante Jerez
Director General de Radio Sonora

RADIO SONORA
Gobierno del Estado de Sonora

II AYUNTAMIENTO
SAN PEDRO DE LA CUEVA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2024 - 2027
SECRETARÍA

RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

SONORA
TIERRA DE OPORTUNIDADES

RADIO SONORA

DEPARTAMENTO TECNICO

FORMATO DE INSPECCION GENERAL EN SITIO

DATOS GENERALES: San Pedro de la Cueva, Sonora.		
DD: 26	MM: 03	AA: 2026

DESCRIPCION GENERAL			
MARCA	DESCRIPCION	MODELO	CONDICIONES TECNICAS
BEXT	Transmisor	LEX 30	NO FUNCIONA
OpenBox	Receptor	X4 PLUS	BUENO
TZ	Torre	TZ 30	REGULAR
Antena FM	Antena		REGULAR
whirlpool	Aire acondicionado		

DESCRIPCION DE SITIO

El sitio ese encontró fuera del aire, el módulo de audio del transmisor no funciona, tiene potencia el equipo mas no entrada de audio.

Aire acondicionado funcionando de manera óptima.

Torre en buenas condiciones.

Sitio con candado

ACTIVIDADES REALIZADAS

Servicio de mantenimiento preventivo a equipos.

Inspección visual de los dispositivos, conexiones y del sitio.

Inspección de parámetros de funcionamiento.

FUNCIONAMIENTO POSTERIOR

El sitio quedo fuera del aire, se retiró el equipo para su posterior reparación en taller (presenta potencia sin audio)

El equipo presenta una potencia de 22.4 watts.


El reflejo del equipo es de 0 watts.

Conexiones en condiciones regulares.


Antena condiciones buenas. Torre condiciones buenas.

Ing. Jorge Luis García Durazo

Ing. Fernando Ornelas

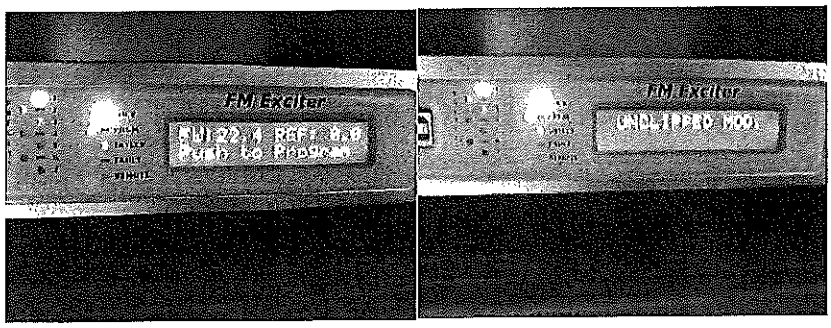



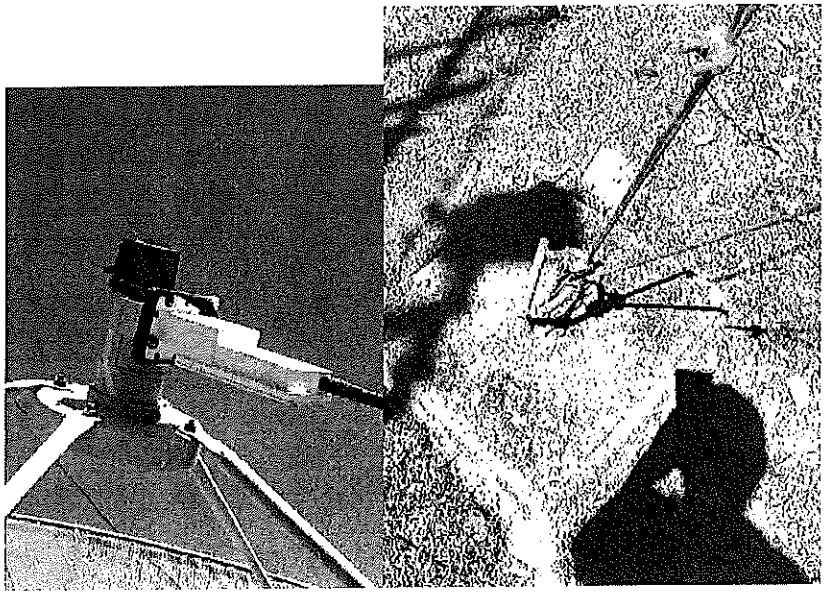



Ing. Jorge Luis García Durazo

Ing. Fernando Ornelas

_____


_____

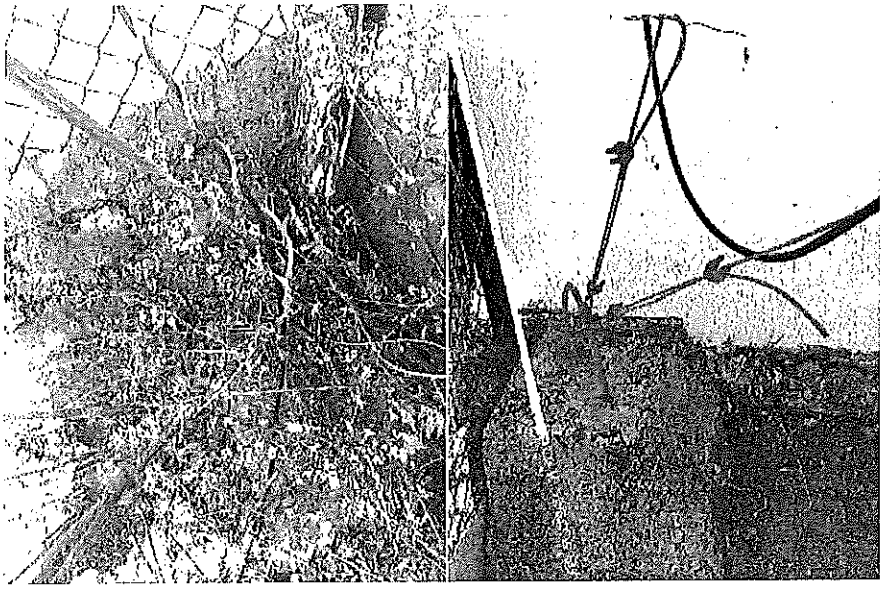


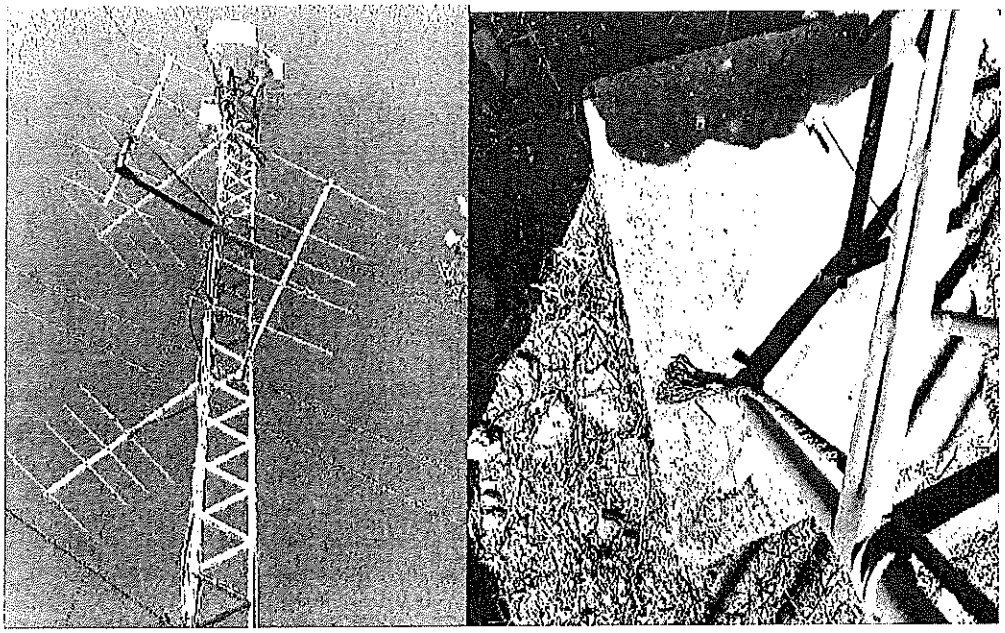

Ing. Jorge Luis García Durazo

Ing. Fernando Ornelas

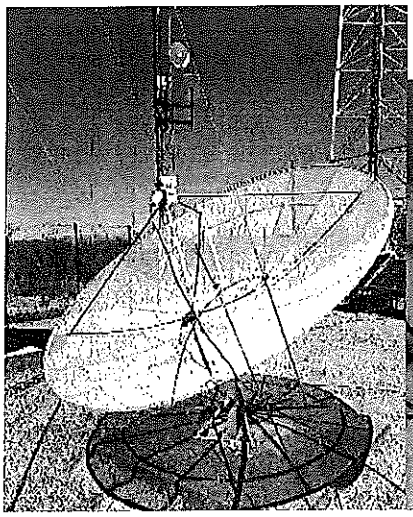

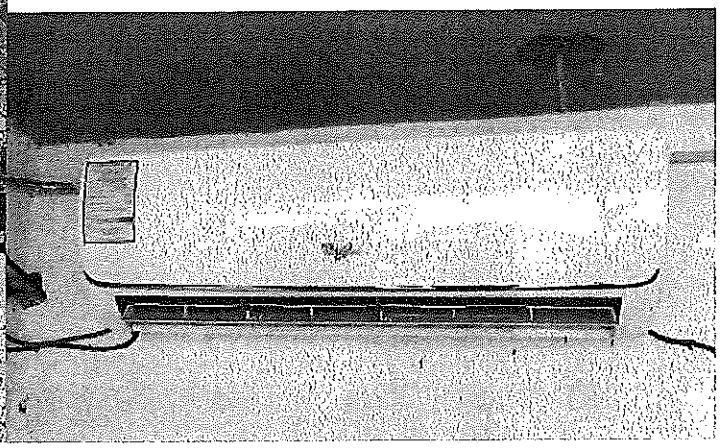

Ing. Jorge Luis García Durazo

Ing. Fernando Ornelas
